

都市計画道路草加三郷線 西袋工区の概要

柳之宮橋架替え工事 今後の予定 ①

都市計画道路草加三郷線 西袋工区の整備は、最も期間を要する柳之宮橋の架替え工事から行います。新たに広い橋を架ける工事には、今の橋を撤去する必要があり、県道、市道を迂回させる必要があります。

①現在の状況(R2.1時点)



①ステップ1工事

(令和2年3月～令和2年夏ごろ)



②ステップ2工事

(令和2年秋ごろ～令和2年冬ごろ予定)



③ステップ3工事

(令和2年冬ごろ～令和4年夏ごろ予定)



※現時点での工事予定であり、天候などの影響により工程が前後します。

工事に際し、騒音・振動、交通の切替において周辺の皆様や道路を利用する皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒、ご協力をお願いします。


ステップごとの交通の切替え情報については、越谷県土整備事務所HP等で随時お知らせします。

都市計画道路草加三郷線 西袋工区の概要


柳之宮橋架替え工事 今後の予定 ②

④ステップ4工事


(令和4年夏ごろ～令和9年冬ごろ予定)

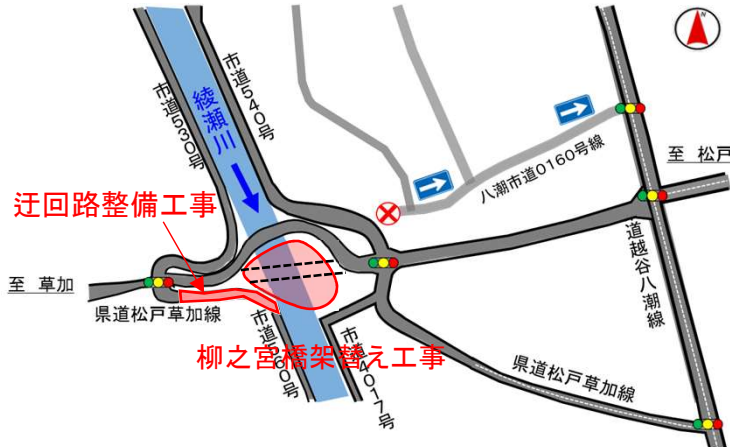

現在の橋



新しい橋



※ステップ4 迂回路整備後 約6年間で新しい橋の架替えが完了する予定です。



⑤ステップ5 完成

(令和10年予定)



新しい橋の架替えが完了後、仮道路から完成道路への切り替えを段階的に行い、左図の4車線道路が完成します。

※現時点での工事予定であり、天候などの影響により工程が前後します。

工事に際し、騒音・振動、交通の切替において周辺の皆様や道路を利用する皆様にはご迷惑をおかけしますが、何卒、ご協力をお願いします。

ステップごとの交通の切替え情報については、越谷県土整備事務所HP等で随時お知らせします。
