


大滝トンネル 工事情報通信


すっかり秋めいて日も短くなってきましたが、風邪などひいていないでしょうか。季節の変わり目は体調を崩しやすくなりますので、体調管理には十分注意し過ごしましょう。大滝トンネルも比較的良質な岩盤が続いており順調に掘削しています。しばらくはこの状態が続くと想定しています。

工事の進捗状況及び、今後の予定

トンネル掘削は、1日6サイクル（7.2m/日）で掘削を進めています。しばらくは大きな地質の変化がないと想定されるので継続して進めて行く予定です。発生した残土は皆野両神荒川線BP及び、10月11日より残土仮置き場箇所（下郷区）へ運搬しています。冬期休暇期間を利用して覆工コンクリート（仕上げのコンクリート）を打つための型枠となるセントルを組み立てる予定をしています。

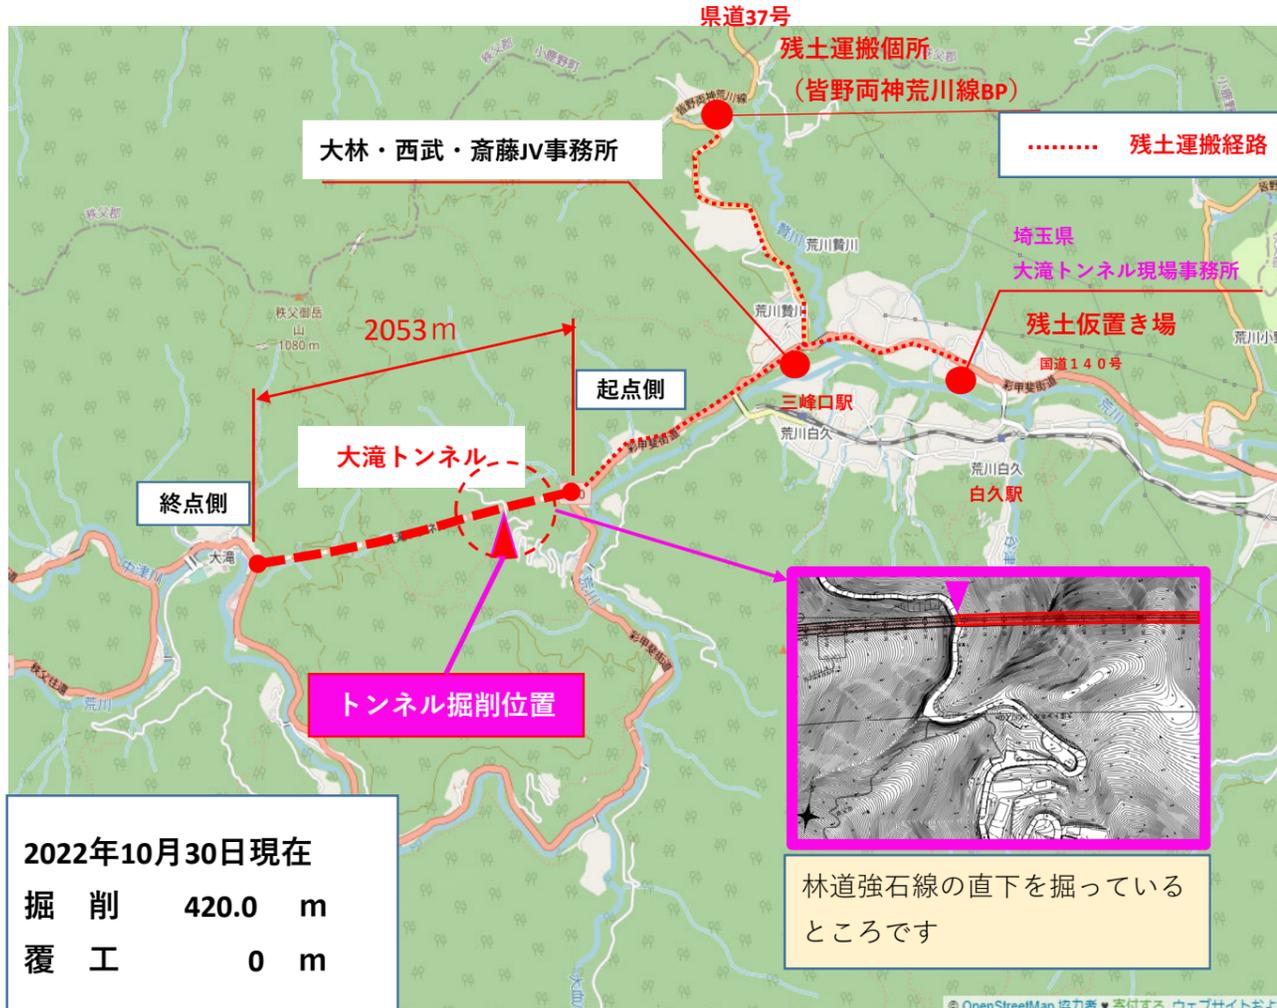

2022年10月30日現在
掘削 420.0 m
覆工 0 m

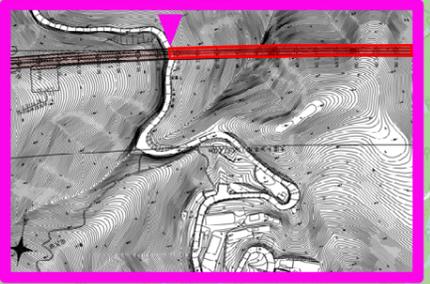

林道強石線の直下を掘っているところです

現場見学会実施

9月から10月にかけて、荒川西小学校、熊谷工業（建築科）、いずみ高校、秩父市役所、小鹿野町議会議員、埼玉県地質業協会など14回に分けて延べ333名の方が来られ、トンネルを掘る機械や、掘削の状況、発破の音などを体験していただきました。荒川西小学校の生徒達には、30tダンプトラックへ搭乗体験等も行い、皆喜んでいただけただので、現場を行っている私たちにも良い励みになりました。



トンネル全景
拡幅断面から標準断面箇所



集塵機
トンネル内の粉じんをきれいにする装置です



付替え道路
栈橋工事が完了し道路取合い箇所を施工しています

問合せ先

大滝トンネル事業全体
に関するお問い合わせはこちら
埼玉県西関東連絡道路建設事務所
住所：秩父郡皆野町皆野2511-1
TEL：0494-62-5811
担当：菅沼、宮城、小池

大滝トンネル本体工事
に関するお問い合わせはこちら
大林・西武・斎藤JV工事事務所
住所：秩父市荒川贅川 703-1
TEL：0494-26-6371
担当：古家、小野寺、寺園
