



大滝トンネル 工事情報通信



新年あけましておめでとうございます。昨年は5月より掘削を開始し、皆様のご協力もあり予定通り掘削する事ができました。今年も丸1年掘削するようになります。また、この正月休暇期間を利用してスライドセントル（覆工するための鋼製型枠）を組立てます。4月からは覆工コンクリートも並行して進めて行く予定です。

工事の進捗状況及び、今後の予定

年末年始の休暇中に組み立てるスライドセントルは、覆工の施工を始める4月頃まで坑内に存置します。

1月から2月は、引き続きトンネル掘削を進めます。地山が変わらなければ、5~6サイクル/日（6~7.2m/日）ずつ掘削します。




スライドセントル

岐阜県の工場で仮組検査を行いました。

現場見学会など

11月から12月も、たくさんの方に現場をご覧頂きました。現場ではトンネル掘削に使う機械や設備、トンネル掘削の状況、発破の音などを体験して頂きました。これまでに視察・見学に来られた方は600人を超えます。

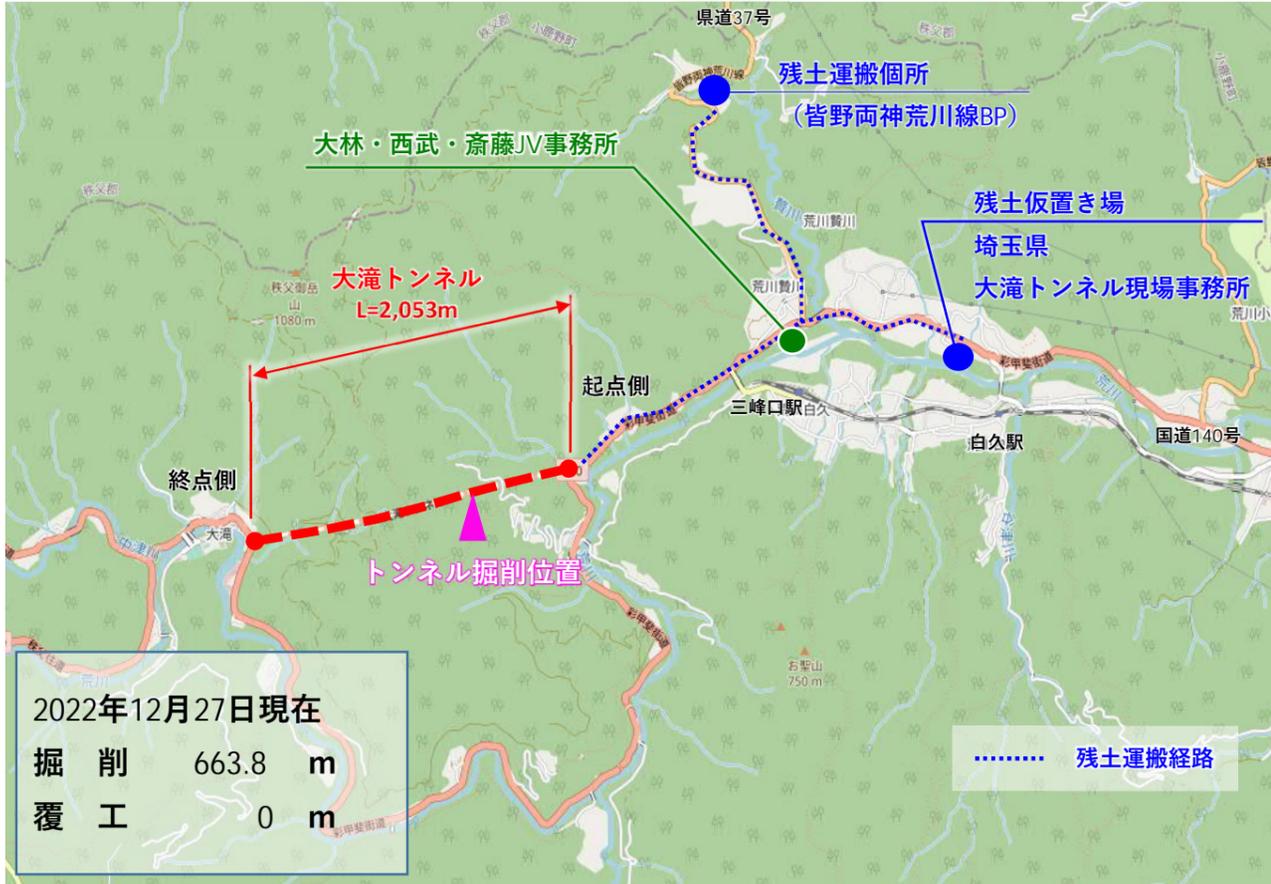

熊谷工業高校（土木科）の皆さん



強石地区・巢場地区の皆さん



山本副知事の視察



滝をイメージしたイルミネーション

12月初旬からイルミネーションを始めました。トンネル名の「大滝」や現場奥にある「白滝」にちなんで、「滝」をイメージしたイルミネーションにしています。皆さんに楽しんで頂ければ幸いです。



トンネル湧水で発電

なお、イルミネーションにはトンネル湧水で発電した電気を使用します。



非常駐車帯

大滝方面
トンネル内で車両が故障した場合などに駐車できるよう、断面を広げています。



30t積重ダンプ（3台目）

掘削延長が延びてきたので、3台目の重ダンプを搬入しました。



付替道路

構造物は完成し、舗装と安全設備の設置を残すのみとなっています。

問合せ先

大滝トンネル事業全体 に関するお問い合わせはこちら

埼玉県西関東連絡道路建設事務所
住所：秩父郡皆野町皆野2511-1
TEL：0494-62-5811
担当：菅沼、宮城、小池

大滝トンネル本体工事 に関するお問い合わせはこちら

大林・西武・斎藤JV工事事務所
住所：秩父市荒川贅川 703-1
TEL：0494-26-6371
担当：古家、小野寺、寺園
